

《建设工程计价》2018年真题

一、单项选择题（共72题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（ ）相对应。

- A. 工程费用+工程建设其他费用
- B. 建设投资+建设期利息
- C. 建设安装工程费+设备及工器具购置费
- D. 建设项目总投资

【答案】B

【解析】本题考查的是建设工程造价构成。生产性建设项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分；非生产性建设项目总投资包括投资建设和建设期利息两部分。其中投资建设和建设期利息之和对应于固定资产投资。

2. 国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（ ）。

- A. 离岸价
- B. 运费在内价
- C. 到岸价
- D. 抵岸价

【答案】A

【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。离岸价，意为装运港船上交货，是指当货物在装运港被装上指定船时，卖方即完成交货义务。风险转移，以在指定的装运港货物被装上指定船时为分界点。费用划分与风险转移的分界点相一致。

3. 国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。

- A. 2.00
- B. 2.10
- C. 2.31
- D. 2.35

【答案】D

【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。专用工具费= $(18+2) \times 5\% = 1$ （万元），废品损失费= $(18+2+1) \times 10\% = 2.1$ （万元），该设备的利润= $(\text{材料费} + \text{加工费} + \text{辅助材料费} + \text{专用工具费} + \text{废品损失费} + \text{包装费}) \times \text{利润率} = (18+2+1+2.1+0.4) \times 10\% = 2.35$ （万元）。

4. 根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（ ）。

- A. 人工费
- B. 企业管理费
- C. 利润
- D. 税金

【答案】D

【解析】本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

5. 根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（ ）。

- A. 指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用
- B. 指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用
- C. 采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣
- D. 包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用

【答案】C



【解析】本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。工具用具使用费是指企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。当一般纳税人采用一般计税方法时,工具用具使用费中增值税进项税额的抵扣原则:以购进货物或接受修理修配劳务适用的税率扣减,均为17%。

6. 按照国外建筑安装工程费用构成惯例,关于其直接工程费中的人工费,下列说法正确的是()。

- A. 工人按技术等级划分为技工、普工和壮工
- B. 平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算
- C. 包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费
- D. 包括工资、加班费和代理人费用

【答案】C

【解析】本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。选项A错误,国外一般工程施工的工人按技术要求划分为高级技工、熟练工、半熟练工和壮工;选项B错误,当工程价格采用平均工资计算时,要按各类工人总数的比例进行加权计算;选项D错误,人工费应该包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费用等。

7. 建设单位通过市场机制取得建设用地,不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用,还须向土地所有者支付()。

- A. 安置补助费
- B. 土地出让金
- C. 青苗补偿费
- D. 土地管理费

【答案】B

【解析】本题考查的是建设用地取得费用。建设用地如通过行政划拨方式取得,则须承担征地补偿费用或对原用地单位或个人的拆迁补偿费用;若通过市场机制取得,则不但承担以上费用,还须向土地所有者支付有偿使用费,即土地出让金。

8. 关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算,下列说法正确的是()。

- A. 改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费
- B. 凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费
- C. 新建项目应根据实际工程量计算,不按工程费用的比例计算
- D. 新建项目应按工程费用比例计算,不根据实际工程量计算

【答案】B

【解析】本题考查的是场地准备及临时设施费。选项A错误,改扩建项目一般只计拆除清理费。选项CD错误,新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算,或按工程费用的比例计算。

9. 某建设项目工程费用5000万元,工程建设其他费用1000万元。基本预备费率为8%,年均投资价格上涨率5%,建设期两年,计划每年完成投资50%。则该项目建设期第二年价差预备费应为()万元。

- A. 160.02
- B. 227.79
- C. 246.01
- D. 326.02

【答案】C

【解析】本题考查的是价差预备费。价差预备费 $= (5000+1000) \times 50\% \times (1+8\%) \times [(1+5\%) \times (1+5\%)^{0.5} - 1] = 246.01$ (万元)。

10. 关于建设期利息计算公式 $q_j = (P_{j-1} + 1/2A_j) \times i$ 的应用,下列说法正确的是()。

- A. 按总贷款在建设期内均衡发放考虑
- B. P_{j-1} 为第(j-1)年年初累计贷款本金和利息之和
- C. 按贷款在年中发放和支用考虑
- D. 按建设期内支付贷款利息考虑

【答案】A

【解析】本题考查的是建设期利息。选项B错误, P_{j-1} ---建设期第(j-1)年末累计贷款本金与利息之和。选项CD错误,在总贷款分年均衡发放前提下,可按当年借款在年中支用考虑,即当年借款按半年计息,上年借款按全年计息。



11. 关于工程造价的分部组合计价原理, 下列说法正确的是 ()。

- A. 分部分项工程费=基本构造单元工程量×工料单价
- B. 工料单价指人工、材料和施工机械台班单价
- C. 基本构造单元是由分部工程适当组合形成
- D. 工程总价是按程序和方法逐级汇总形成的工程造价

【答案】D

【解析】本题考查的是工程计价基本原理。选项 A 错误, 分部分项工程费=∑[基本构造单元工程量(定额项目或清单项目)×相应单价]。选项 B 错误, 工料单价仅包括人工、材料、机具使用费。选项 C 错误, 按照计价需要, 将分项工程进一步分解或适当组合, 得到基本构造单元。

12. 反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的定额是 ()。

- A. 概算指标
- B. 概算定额
- C. 预算定额
- D. 施工定额

【答案】B

【解析】本题考查的是工程定额体系。概算定额是完成单位合格扩大分项工程或扩大结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量及其费用标准。

表 2.1.1 各种定额间关系的比较

	施工定额	预算定额	概算定额	概算指标	投资估算指标
对象	施工过程或基本工序	分项工程或结构构件	扩大的分项工程或扩大的结构构件	单位工程	建设项目、单项工程、单位工程
用途	编制施工预算	编制施工图预算	编制扩大初步设计概算	编制初步设计概算	编制投资估算
项目划分	最细	细	较粗	粗	很粗
定额水平	平均先进	平均			
定额性质	生产性定额	计价性定额			

13. 关于工程量清单计价适应范围, 下列说法正确的是 ()。

- A. 达到或超过规定建设规模的工程, 必须采用工程量清单计价
- B. 达到或超过规定投资数额的工程, 必须采用工程量清单计价
- C. 国有资金占投资总额不足 50% 的建设工程发承包, 不必采用工程量清单计价
- D. 不采用工程量清单计价的建设工程, 应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定

【答案】D

【解析】本题考查的是工程量清单计价与工程量计算规范概述。使用国有资金投资的建设工程发承包, 必须采用工程量清单计价; 非国有资金投资的建设工程, 宜采用工程量清单计价; 不采用工程量清单计价的建设工程, 应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定外的其他规定。国有资金(含国家融资资金)为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额 50% 以上, 或虽不足 50% 但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。

14. 招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是 ()。

- A. 材料材质
- B. 结构部位
- C. 工程内容
- D. 规格尺寸

【答案】C

【解析】本题考查的是分部分项工程项目清单。工程内容是指完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序, 但应注意, 在编制分部分项工程项目清单时, 工程内容通常无须描述。



15. 根据《建设工程工程量计价规范》(GB 50500-2013),关于其他项目清单的编制和计价,下列说法正确的是()。
- A. 暂列金额由招标人在工程量清单中暂定
 - B. 暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价
 - C. 专业工程暂估价中包括规费和税金
 - D. 计日工单价中不包括企业管理费和利润

【答案】A

【解析】本题考查的是其他项目清单。选项 B 错误,暂估价包括暂不能确定价格的材料暂定价。选项 C 错误,专业工程的暂估价一般应是综合暂估价,包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润,不包括规费和税金。选项 D 错误,计日工单价包括企业管理费和利润。

16. 已知某人工抹灰 10m² 的基本工作时间为 4 小时,辅助工作时间占工序作业时间的 5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的 6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为() 工日/100m²。

- A. 6.3
- B. 6.56
- C. 6.58
- D. 6.67

【答案】C

【解析】本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。 $4 \text{ 小时} = 4/8 = 0.5$ (工日), 100m^2 所需的时间定额 $= 0.5 / (1 - 5\%) / (1 - 6\% - 11\% - 3\%) \times 10 = 6.58$ (工日)。

17. 关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法,下列说法正确的是()。

- A. 理论算法适用于确定材料净用量
- B. 必须消耗的材料量是指材料的净用量
- C. 土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料
- D. 现场统计法主要适用于确定材料损耗量

【答案】A

【解析】本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。选项 B 错误,必须消耗的材料属于施工正常消耗,是确定材料消耗定额的基本数据。其中:直接用于建筑和安装工程的材料,编制材料净用量定额;不可避免的施工废料和材料损耗,编制材料损耗定额。选项 C 错误,土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于实体材料中的辅助材料。选项 D 错误,现场统计法一般只能确定材料总消耗量,不能确定净用量和损耗量。

18. 某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼 25m³,泵的时间利用系数为 0.75,则该砼输送泵的产量定额为()。

- A. 150m³/台班
- B. 0.67 台班/100m³
- C. 200m³/台班
- D. 0.50 台班/100m³

【答案】A

【解析】本题考查的是确定机具台班定额消耗量的基本方法。产量定额 $= 25 \times 0.75 \times 8 = 150$ (m³/台班)。

19. 某材料原价为 300 元/t,运杂费及运输损耗费合计为 50 元/t,采购及保管费费率 3%,则该材料预算单价为() 元/t。

- A. 350.0
- B. 359.0
- C. 360.5
- D. 360.8

【答案】C

【解析】本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料预算单价 $= (300 + 50) \times (1 + 3\%) = 360.5$ (元/t)。

20. 关于施工机械台班单价的确定,下列表达式正确的是()。

- A. 台班折旧费 = 机械原值 $\times (1 - \text{残值率}) / \text{耐用总台班}$
- B. 耐用总台班 = 检修间隔台班 $\times (\text{检修次数} + 1)$
- C. 台班检修费 = 一次检修费 $\times \text{检修次数} / \text{耐用总台班}$



D. 台班维护费= Σ (各级维护一次费用 \times 各级维护次数)/耐用总台班

【答案】B

【解析】本题考查的是施工机械台班单价的组成和确定方法。选项A错误,台班折旧费=机械预算价格 \times (1-残值率)/耐用总台班。选项C错误,台班检修费=一次检修费 \times 检修次数/耐用总台班 \times 除税系数。选项D错误,台班维护费= Σ [(各级维护一次费用 \times 各级维护次数 \times 除税系数)+临时故障排除费]/耐用总台班。

21. 编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时,已知基本用工,辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日,人工幅度差系数为10%。则该分项工程单位人工工日消耗量为()工日。

A. 27.0

B. 27.2

C. 27.3

D. 27.5

【答案】D

【解析】本题考查的是预算定额及其基价编制。该分项工程单位人工工日消耗量=(20+2+3) \times (1+10%)=27.5(工日)。

22. 关于预算定额消耗量的确定方法,下列表述正确的是()。

A. 人工工日消耗量由基本用工量和辅助用工量组成

B. 材料消耗量=材料净用量/(1-损耗率)

C. 机械幅度差包括了正常施工条件下,施工中不可避免的工序间歇

D. 机械台班消耗量=施工定额机械台班消耗量/(1-机械幅度差)

【答案】C

【解析】本题考查的是预算定额及其基价编制。选项A错误,人工工日消耗量由基本用工量和其他用工量组成。选项B错误,材料消耗量=材料净用量 \times (1+损耗率)。选项D错误,机械台班消耗量=施工定额机械台班消耗量 \times (1+机械幅度差)。

23. 关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是()。

A. 概算指标通常以分部工程为对象

B. 概算指标中各种消耗量指标的确定,主要来自预算或结算资料

C. 概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分

D. 概算指标的使用及调整方法,一般在附录中说明

【答案】B

【解析】本题考查的是概算指标及其编制。选项A错误,概算指标则是以单位工程为对象。选项C错误,概算指标的组成内容一般分为文字说明和列表形式两部分,以及必要的附录。选项D错误,总说明和分册说明,其内容一般包括:概算指标的编制范围、编制依据、分册情况、指标包括的内容、指标未包括的内容、指标的使用方法、指标允许调整的范围及调整方法等。

24. 关于工程造价指数,下列说法正确的是()。

A. 按编制方法的不同,可分为数量指标指数、质量指标指数

B. 产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数

C. 按所反映现象的性质不同,分为综合指数和平均数指数

D. 设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示

【答案】B

【解析】本题考查的是工程造价指数的编制和动态管理。选项A错误,指数按其所编制的方法不同,分为综合指数和平均数指数。选项C错误,指数按其所反映的现象的性质不同,分为数量指标指数和质量指标指数。选项D错误,设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。

25. 下列工程造价信息中,最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是()。

A. 工程价格信息

B. 政策性文件

C. 计价标准和规范

D. 工程定额

【答案】A



【解析】本题考查的是工程造价信息及其主要内容。工程造价信息需要经常不断地收集和补充新的内容,进行信息更新,真实反映工程造价的动态变化。

26. 关于项目建设规模,下列说法正确的是()。

- A. 建设规模越大,产生的效益越高
- B. 国家不对行业的建设规模设定规模界限
- C. 资金市场条件对建设规模的选择起着制约作用
- D. 技术因素是确定建设规模需考虑的首要因素

【答案】C

【解析】本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。原材料市场、资金市场、劳动力市场等对建设规模的选择起着不同程度的制约作用。

27. 关于工业项目建设地点的选择,下列说法正确的是()。

- A. 应远离其他工业项目,减少环境保护费用
- B. 应远离铁路、公路、水路,减少运营干扰
- C. 应靠近城镇和居民密集区,减少生活设施费
- D. 应少占耕地,降低土地补偿费用

【答案】D

【解析】本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。选择建设地点(厂址)的要求:(1)节约土地,少占耕地,降低土地补偿费用。(2)减少拆迁移民数量。(3)应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段。(4)要有利于厂区合理布置和安全运行。(5)应尽量靠近交通运输条件和水电供应等条件好的地方。(6)应尽量减少对环境的污染。

28. 关于建设项目投资估算的编制,下列说法正确的是()。

- A. 应直接委托造价工程师编制
- B. 应做到费用构成齐全,并适当降低估算标准,节省投资
- C. 项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内
- D. 应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

【答案】D

【解析】本题考查的是投资估算的编制。选项A错误,应委托有相应工程造价咨询资质的单位编制。选项B错误,应做到工程内容和费用构成齐全,不漏项,不提高或降低估算标准,计算合理,不少算、不重复计算。选项C错误,项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在±30%以内。

29. 某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数(定基指数)分别为1.12和1.15,生产能力指数为0.7,预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为()万元。

- A. 7147.08
- B. 7535.09
- C. 7911.84
- D. 8307.43

【答案】B

【解析】本题考查的是静态投资部分的估算方法。该项目的静态投资=6000×(20/15)^{0.7}×(1.15/1.12)=7535.09(万元)。

30. 采用分项详细估算法进行流动资金估算时,应计入流动负债的是()。

- A. 预收账款
- B. 存货
- C. 库存资金
- D. 应收账款

【答案】A

【解析】本题考查的是流动资金的估算。流动负债是指在一年或者超过一年的一个营业周期内,需要偿还的各种债务,包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其他暂收应



付款、预提费用和一年内到期的长期借款等。

31. 某建设项目投资估算中, 建设管理费 2000 万元, 可行性研究费 100 万元, 勘察设计费 5000 万元, 引进技术和引进设备其他费 400 万元, 市政公用设施建设及绿化费 2000 万元, 专利权使用费 200 万元, 非专利技术使用费 100 万元, 生产准备及开办费 500 万元。则按形成资产法编制建设投资估算表, 计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为 ()。

- A. 10000 万元、300 万元、0 万元
- B. 9600 万元、700 万元、0 万元
- C. 9500 万元、300 万元、500 万元
- D. 9100 万元、700 万元、500 万元

【答案】C

【解析】本题考查的是投资估算的编制。固定资产费用是指项目投产时将直接形成固定资产的建设投资, 包括工程费用和工程建设其他费用中按规定将形成固定资产的费用, 后者被称为固定资产其他费用, 主要包括建设管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、专项评价及验收费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费、特殊设备安全监督检查费和市政公用设施建设及绿化费等; 无形资产费用是指将直接形成无形资产的建设投资, 主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等; 其他资产费用是指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分, 如生产准备及开办费等。固定资产=2000+100+5000+400+2000=9500 (万元), 无形资产=200+100=300 (万元), 其他资产=500 (万元)。

32. 关于设计概算的作用, 下列说法正确的是 ()。

- A. 设计概算是确定建设规模的依据
- B. 设计概算是编制固定资产投资计划的依据
- C. 政府投资项目设计概算经批准后, 不得进行调整
- D. 设计概算不应作为签订贷款合同的依据

【答案】B

【解析】本题考查的是设计概算的概念及其编制内容。选项 A 错误, 设计概算是以初步设计文件为依据, 按照规定的程序、方法和依据, 对建设项目总投资及其构成进行的概略计算。选项 C 错误, 政府投资项目的设计概算经批准后, 一般不得调整。如果由于下列原因需要调整概算时, 应由建设单位调查分析变更原因, 报主管部门审批同意后, 由原设计单位核实编制调整概算, 并按有关审批程序报批。选项 D 错误, 设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据。

33. 采用概算定额法编制设计概算的主要工作有: ①列出分部分项工程项目名称并计算工程量; ②搜集基础资料; ③编写概算编制说明; ④计算措施项目费; ⑤确定各分部分项工程费; ⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是 ()。

- A. ②①⑤④⑥③
- B. ②③①⑤④⑥
- C. ③②①④⑤⑥
- D. ②①③⑤④⑥

【答案】A

【解析】本题考查的是设计概算的编制。概算定额法编制设计概算的步骤如下: (1) 搜集基础资料、熟悉设计图纸和了解有关施工条件和施工方法。(2) 按照概算定额子目, 列出单位工程中分部分项工程项目名称并计算工程量。(3) 确定各分部分项工程费。(4) 计算措施项目费。(5) 计算汇总单位工程概算造价。(6) 编写概算编制说明。

34. 关于设计概算的编制, 下列计算式正确的是 ()。

- A. 单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润
- B. 单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费
- C. 单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用
- D. 建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费

【答案】B

【解析】本题考查的是设计概算的编制。选项 A 错误, 单位工程概算造价=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管



理费+利润+规费税金+设备及工器具购置费;选项C错误, 单项工程综合概算=建筑工程费用+安装工程费用+设备及工器具购置费;选项D错误, 建设项目总概算=单项工程综合概算+工程建设其他费+建设期利息+预备费+铺底流动资金。

35. 用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价, 下列做法正确的是 ()。

- A. 分项工程名称与定额名称完全一致时, 直接套用定额预算单价
- B. 分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时, 直接套用定额预算单价
- C. 分项工程主要材料品种与预算定额不一致时, 直接套用定额预算单价
- D. 分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时, 调整定额预算单价后套用

【答案】D

【解析】本题考查的是施工图预算的编制。选项AB错误, 分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时, 可以直接套用预算单价;选项C错误, 分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时, 不可以直接套用预算单价, 需要按实际使用材料价格换算预算单价;选项D正确, 定额基价=人工费+材料费+机具使用费, 分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机具的数量增减时, 一般调量不调价, 此时是调整人工、机具的消耗量, 人工、机具等数量的增减导致定额基价改变, 因此是调整定额预算单价后套用。

36. 采用全费用综合单价法编制施工图预算, 下列说法正确的是 ()。

- A. 综合单价应由人材机费、管理费、综合计取的措施项目费、规费和税金构成
- B. 可以计量的措施项目费与分部分项工程费的计算方法相同
- C. 人工费、材料费、施工机具使用费应按预算定额发布时期的价格确定
- D. 综合计取的措施项目费应以分部分项工程费为基数乘以相应费率计算

【答案】B

【解析】本题考查的是施工图预算的编制。选项A错误, 综合单价由人工费、材料费、机具费、管理费、利润、规费和税金组成。选项C错误, 人工费、材料费、机具费应根据相应的预算定额子目的人材机要素消耗量, 以及报告编制期人材机的市场价格(不含增值税进项税额)等因素确定。选项D错误, 综合计取的措施项目费应以该单位工程的分部分项工程费和可以计量的措施项目费之和为基数乘以相应费率计算。

37. 直接发包项目如按初步设计总概算投资包干, 其签约合同价应以 () 为准。

- A. 经审批的概算投资总额
- B. 经审批的概算投资相对应的建筑安装费用
- C. 经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资
- D. 经审批的概算投资中相对应的工程费用

【答案】C

【解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。对于招标发包的项目, 即以招标投标方式签订的合同中, 应以中标时确定的金额为准;对于直接发包的项目, 如按初步设计总概算投资包干时, 应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为签约合同价;如按施工图预算包干, 则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。

38. 关于施工招标文件的疑问和澄清, 下列说法正确的是 ()。

- A. 投标人可以口头方式提出疑问
- B. 投标人不得在投标截止前的15天内提出疑问
- C. 投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置
- D. 招标文件的书面澄清应发给所有投标人

【答案】D

【解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。选项A错误, 应为书面形式。选项B错误, 有疑问, 投标人应在规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式), 要求招标人对招标文件予以澄清。选项C错误, 投标人收到澄清后的确认时间可以是相对的时间, 也可以是绝对时间。

39. 关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则, 下列说法正确的是 ()。

- A. 招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责
- B. 招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责



- C. 投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责
D. 投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

【答案】A

【解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。招标人对工程量清单中各分部分项工程或适合以分部分项工程项目清单设置的措施项目的工程量的准确性和完整性负责。

40. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)关于招标工程量清单中暂列金额的编制,下列说法正确的是()。

- A. 应详列其项目名称、计量单位,不列明金额
B. 应列明暂定金额总额,不列明项目名称
C. 不同专业预留的暂列金额应分别列项
D. 没有特殊要求一般不列暂列金额

【答案】C

【解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。暂列金额由招标人填写其项目名称、计量单位、暂定金额等,若不能详列,也可只列暂定金额总额。不同专业预留的暂列金额应分别列项。

41. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)中对招标控制价的有关规定,下列说法正确的是()。

- A. 招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调
B. 招标人可以只公布招标控制价总价,也可以只公布单价
C. 招标控制价可以在招标文件中公布,也可以在开标时公布
D. 高于招标控制价的投标报价应被拒绝

【答案】D

【解析】本题考查的是招标控制价的编制。招标控制价应在招标文件中公布,对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调。招标人应当在招标时公布招标控制价的总价,以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。

42. 施工投标报价工作包括:①工程现场调查;②组建投标报价班子;③确定基础标价;④制定项目管理规划;⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是()。

- A. ①④②③⑤
B. ②③④①⑤
C. ①②③④⑤
D. ②①⑤④③

【答案】D

【解析】本题考查的是投标报价前期工作。



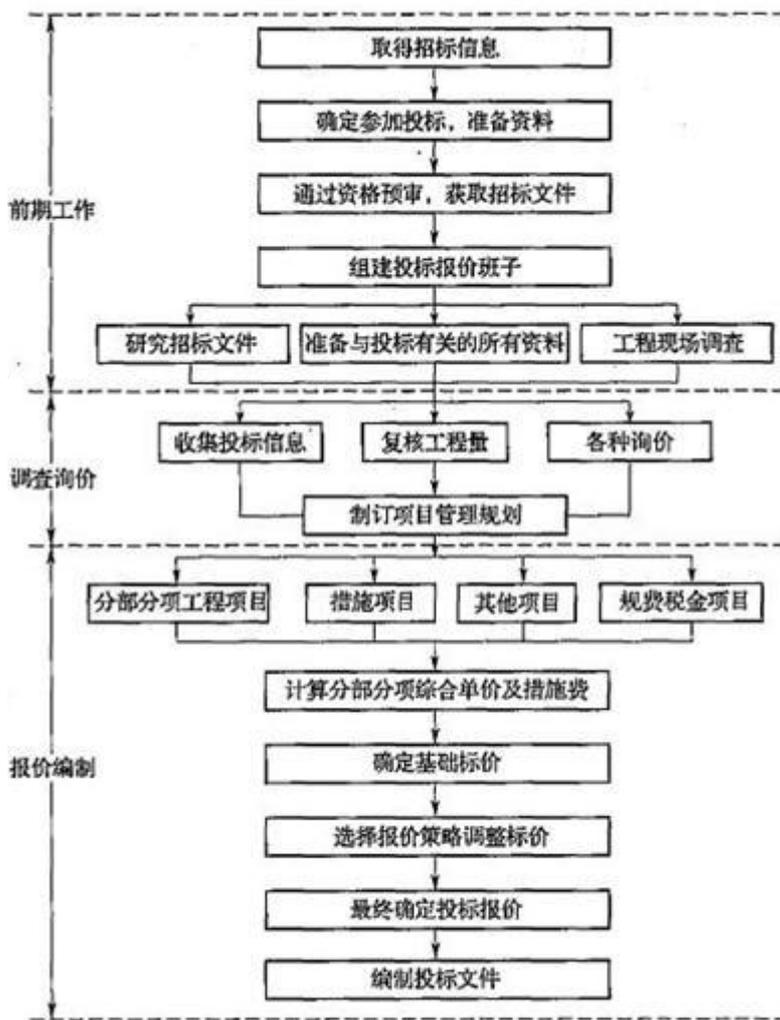


图 4.2.1 投标报价编制流程图

43. 相较于在劳务市场招募零散劳动力, 承包人选用成建制劳务公司的劳务分包具有 () 的特点。

- A. 价格低, 管理强度低
- B. 价格高, 管理强度低
- C. 价格低, 管理强度高
- D. 价格高, 管理强度高

【答案】B

【解析】本题考查的是询价与工程量复核。劳务询价主要有两种情况：一是成建制的劳务公司，相当于劳务分包，一般费用较高，但素质较可靠，工效较高，承包商的管理工作较轻；另一种是劳务市场招募零散劳动力，根据需要进行选择，这种方式虽然劳务价格低廉，但有时素质达不到要求或工效较低，且承包商的管理工作较繁重。

44. 关于工程施工投标报价过程中的工程量复核, 下列说法正确的是 ()。

- A. 复核的准确程度不会影响施工方法的选用
- B. 复核的目的在于修改工程量清单中的工程量
- C. 复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料
- D. 复核中发现的遗漏和错误须向招标人提出

【答案】C

【解析】本题考查的是询价与工程量复核。选项 A 错误，复核工程量的准确程度，将影响承包商的经营行为：一是根据复核后的工程量与招标文件提供的工程量之间的差距，从而考虑相应的投标策略，决定报价尺度；二是根据工程量的大小采取合适的施工方法，选择适用、经济的施工机具设备、投入使用相应的劳动力数量等。选项 B 错误，复核工程量的目的不是修改工程量清单。选项 D 错误，针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。



45. 招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致, 则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是 ()。

- A. 计算工程内容的工程数量
- B. 计算工程内容的清单单位含量
- C. 计算措施项目的费用
- D. 计算管理费、利润和风险费用

【答案】D

【解析】本题考查的是投标报价的编制方法和内容。计算管理费、利润和风险费用是综合单价不可或缺的工作。

46. 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等, 评标委员评标发现的投标报价算数错误, 应由 () 进行修正。

- A. 评标委员会
- B. 招标监督机构
- C. 招标人
- D. 投标人

【答案】A

【解析】本题考查的是评标的准备与初步评审。评标委员会按原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的, 其投标被否决。

47. 某招标工程采用综合评估法评标, 报价越低的报价得分越高。评分因素、权重及各投标人得分情况见下表。则推荐的第一中标候选人应为 ()。

评分因素	权重 (%)	投标人得分		
		甲	乙	丙
施工组织设计	30	90	100	80
项目管理机构	20	80	90	100
投标报价	50	100	90	80

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 甲或乙

【答案】A

【解析】本题考查的是详细评审标准与方法。投标甲得分 = $90 \times 30\% + 80 \times 20\% + 100 \times 50\% = 93$; 投标乙得分 = $100 \times 30\% + 90 \times 20\% + 90 \times 50\% = 93$; 投标丙得分 = $80 \times 30\% + 100 \times 20\% + 80 \times 50\% = 84$ 。但由于投标人甲的报价得分高, 报价低, 故第一中标候选人应为甲。

48. 依法必须招标的项目, 中标公示应包含的内容是 ()。

- A. 评标委员会全体成员名单
- B. 所有投标人名单及排名情况
- C. 投标人的各评分要素的得分情况
- D. 中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况 (有业绩信誉条件的)

【答案】D

【解析】本题考查的是中标人的确定。公示内容: 招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示, 而不是只公示排名第一的中标候选人。同时, 对有业绩信誉条件的项目, 在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况, 应一并进行公示, 但不含投标人的各评分要素的得分情况。

49. 工程总承包的签约合同价中不包括暂估价, 且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的, 该专业工程应由 () 招标确定分包人。

- A. 项目主管部门
- B. 发包人
- C. 承包人
- D. 发包人或承包人

【答案】D



【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的约定。发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的,由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。

50. 工程总承包投标人进行标高金报价决策时,首先要进行的工作是()。

- A. 对风险进行评估
- B. 价值增值分析
- C. 选择合理的风险费率
- D. 进行成本分析

【答案】B

【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的约定。标高金决策,由于这是带给总承包商的价值增值部分,因此首先要进行价值增值分析,然后对风险进行评估,选择合适的风险费率,最后用特定的方法如报价的博弈模型等对不同的报价方案进行决策,选择最适合的报价方案。

51. 国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括()。

- A. 国内标准工资,不包括国内附加工资和补贴
- B. 国内、国际差旅费,不包括派出工人的企业收取的管理费
- C. 按当地市场预测的工资预涨费
- D. 按当地工人保险费标准计算的保险费

【答案】D

【解析】本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。国内派出工人工资单价主要包括:(1)国内工资,包括标准工资、附加工资和补贴;(2)派出工人的企业收取的管理费;(3)服装费、卧具及住房费;(4)国内、国际差旅费;(5)国外津贴费和伙食费;(6)奖金及加班费;(7)福利费;(8)工资预涨费,按我国工资现行规定计算,工期较短的工程可不考虑;(9)保险费,按当地工人保险费标准计算。

52. 关于法规变化类合同价款的调整,下列说法正确的是()。

- A. 不实行招标的工程,一般以施工合同签订前的第42天为基准日
- B. 基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的,应予调整
- C. 基准日之后国家政策对材料价格的影响,如已包含在物价波动调价公式中,不再予以考虑
- D. 承包人原因导致的工期延误期间,国家政策变化引起工程造价变化的,合同价款不予调整

【答案】C

【解析】本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。选项A错误,不实行招标的工程,一般以施工合同签订前的第28天为基准日。选项B错误,对于基准日之后发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险,应当由发包人承担。选项D错误,如果由于承包人的原因导致的工期延误,按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的,造成合同价款增加的,合同价款不予调整;造成合同价款减少的,合同价款予以调整。

53. 关于计日工费用的确认和支付,下列说法正确的是()。

- A. 承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量
- B. 发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款
- C. 已标价工程量清单中没有计日工单价的,由发包人确定价格
- D. 已标价工程量清单中没有计日工单价的,由承包人确定价格

【答案】A

【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。任一计日工项目实施结束,承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量,并根据核实的工程数量和承包人已标价工程量清单中的计日工单价计算,提出应付价款;已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,由发承包双方按工程变更的有的规定商定计日工单价计算。

54. 某项目施工合同约定,承包人承租的水泥价格风险幅度为 $\pm 5\%$,超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t,2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为()元/t。

- A. 418



- B. 427.5
C. 430
D. 440

【答案】D

【解析】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。2018年3月信息价下降,应以较低的投标报价计算合同约定的风险幅度值。 $440 \times (1-5\%) = 418$, $430 > 418$, 结算价不变,按投标人投标价格440计算。

55. 发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价,下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是()。

- A. 依法可不招标的项目,应由发包人组织采购,以采购价格取代暂估价
B. 依法可不招标的项目,应由承包人按合同约定采购,以发包人确认后的价格取代暂估价
C. 依法必须招标的项目,应由发包人招标选择供应商,以中标价格取代暂估价
D. 依法必须招标的项目,应由承包人招标选择供应商,以中标价格取代暂估价

【答案】B

【解析】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。给定暂估价的材料、工程设备:(1)不属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的,由承包人按照合同约定采购,经发包人确认后以此为依据取代暂估价,调整合同价款。(2)属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备属于依法必须招标的,由发承包双方以招标的方式选择供应商。依法确定中标价格后,以此为依据取代暂估价,调整合同价款。

56. 因不可抗力造成的下列损失,应由承包人承担的是()。

- A. 工程所需清理、修复费用
B. 运至施工场地待安装设备的损失
C. 承包人的施工机械设备损坏及停工损失
D. 停工期间,发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用

【答案】C

【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期:(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担。

57. 某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成,两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对工期赔偿费的约定是:每延误一个日历天应赔偿2万元,且总赔偿费不超过合同总价款的5%。该工程主体工程按期通过竣工验收,附属工程延误30日历天后通过竣工验收,则该工程的工期赔偿费为()万元。

- A. 10
B. 12
C. 50
D. 60

【答案】B

【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。附属工程延误30日历天应赔偿 $30 \times 2 = 60$ (万元),总赔偿费最高 $= (800 + 200) \times 5\% = 50$ (万元)。而主体工程按期通过竣工验收,工期补偿费应按比例扣减,则该工程的工期赔偿费 $= 60 - 800 / 1000 \times 60 = 12$ (万元)。

58. 根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,下列引起承包人索赔的事件中,只能获得费用补偿的是()。

- A. 发包人提前向承包人提供材料、工程设备
B. 因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格
C. 发包人在工程竣工前提前占用工程
D. 异常恶劣的气候条件,导致工期延误

【答案】A



【解析】本题考查的是索赔。选项 BC 可索赔工期+费用+利润; 选项 D 只能索赔工期。

59. 某工程进度计划网络图上的工作 X (在关键线路上) 与工作 Y (在非关键线路上) 同时受到异常恶劣气候条件的影响, 导致 X 工作延误 10 天, Y 工作延误 35 天, 该气候条件未对其他工作造成影响。若 Y 工作的自由时差为 20 天, 则承包人可向发包人索赔的工期是 () 天。

- A. 10
- B. 15
- C. 25
- D. 35

【答案】B

【解析】本题考查的是索赔。关键线路: 承包人可以向发包人索赔的工期是 10 天; Y 工作延误 35 天, 自由时差是 20 天, 非关键线路可索赔的工期是 $35-20=15$ (天)。两者取较大值, 故可索赔 15 天。

60. 采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是 ()。

- A. 从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣
- B. 从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
- C. 从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
- D. 从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣

【答案】C

【解析】本题考查的是预付款及期中支付。起扣点计算法从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣。

61. 关于安全文明施工费的支付, 下列说法正确的是 ()。

- A. 按施工工期平均分摊安全文明施工费, 与进度款同期支付
- B. 按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费, 与进度款同期支付
- C. 在开工后 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%, 其余部分与进度款同期支付
- D. 在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%。其余部分与进度款同期支付

【答案】C

【解析】本题考查的是预付款及期中支付。发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%, 其余部分按照提前安排的原则进行分解, 与进度款同期支付。

62. 工程量清单计价项目采用单价合同的, 工程竣工结算编制中一般不允许调整的是 ()。

- A. 分部分项工程的清单数量
- B. 安全文明施工费的清单总额
- C. 已标价工程量清单综合单价
- D. 总承包服务费清单总额

【答案】C

【解析】本题考查的是竣工结算。采用单价合同的, 在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变, 并按合同约定进行计量, 且应按实际完成的工程量进行计量。

63. 关于政府投资项目竣工结算的审核, 下列说法正确的是 ()。

- A. 单位工程竣工结算由承包人审核
- B. 单项工程竣工结算由承包人审核
- C. 建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核
- D. 竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

【答案】D

【解析】本题考查的是竣工结算。国有资金投资建设项目的发包人, 应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核。

64. 因不可抗力解除合同的, 发包人不应向承包人支付的费用是 ()。

- A. 临时工程拆除费
- B. 承包人未交付材料的货款
- C. 已实施的措施项目应付价款



D. 承包人施工设备运离现场的费用

【答案】B

【解析】本题考查的是竣工结算。由于不可抗力解除合同的, 发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款, 还应支付下列金额: (1) 合同中约定应由发包人承担的费用。(2) 已实施或部分实施的措施项目应付价款。(3) 承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款, 该材料和工程设备即成为发包人的财产。(4) 承包人撤离现场所需的合理费用, 包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。(5) 承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用, 且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。

65. 某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定, 当发生工程欠款事件时, 下列利息支付的说法中错误的是 ()。

- A. 按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息
- B. 建设工程已实际交付的, 计息日为交付之日
- C. 建设工程没有交付的, 计息日为提交竣工结算文件之日
- D. 建设工程未交付的, 工程价款也未结算的, 计息日为当事人起诉之日

【答案】A

【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的, 按照约定处理; 没有约定的, 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

66. 工程造价鉴定取证工作中, 下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中, 属于鉴定委托人转交的举证资料的是 ()。

- A. 有效的施工合同
- B. 经审批的施工方案
- C. 当事人双方确认的现场签证
- D. 对争议事件各方当事人理由

【答案】D

【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。鉴定委托人向鉴定机构转交, 但要求鉴定机构对资料有效性进一步认定的资料称为鉴定委托人转交的举证资料。鉴定委托人向鉴定机构交付、能直接用作鉴定依据的资料称为鉴定资料。选项 ABC 都是可以直接使用的资料, 而选项 D 需要鉴定机构进一步认定。

67. 依据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216) 订立的工程总承包合同, 采用的合同价款形式是 ()。【教材变动】

- A. 固定单价
- B. 可调单价
- C. 固定总价
- D. 可调总价

【答案】C

【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的结算。依据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》GF-2011-0216 (以下简称《总承包合同示范文本》) 订立的工程总承包合同, 采用的是固定总价合同形式, 除发包人确认的工程变更、价格调整和索赔款项外, 合同价格不做调整。

68. 根据 FIDIC《施工合同条件》(1999 年版) 通用条款, 因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是 ()。

- A. 实际分项工程量变化大于 15%
- B. 该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的 0.01%
- C. 工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了 2%
- D. 该部分工程量变更导致直接费受到损失

【答案】B

【解析】本题考查的是国际工程合同价款的结算。因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括: (1) 该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于 10%; (2) 该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的 0.01%; (3) 由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程费用的变动超过 1%; (4) 该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。



69. 关于建设项目竣工验收, 下列说法正确的是 ()。

- A. 中间验收是指单位工程验收
- B. 单位工程验收由业主组织
- C. 工程整体验收也称交工验收
- D. 交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收

【答案】A

【解析】本题考查的是建设项目竣工验收的方式与程序。选项 B 错误, 单位工程验收由监理单位组织。选项 C 错误, 工程整体验收又称为动用验收。选项 D 错误, 交工验收 (单项工程验收) 由业主组织。

70. 竣工决算文件中, 主要反映竣工工程建设成果和经验, 全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是 ()。

- A. 竣工财务决算说明书
- B. 竣工财务决算报表
- C. 工程竣工造价对比分析
- D. 工程竣工验收报告

【答案】A

【解析】本题考查的是竣工决算的内容和编制。竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验, 是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件, 是全面考核分析工程投资与造价的书面总结, 是竣工决算报告的重要组成部分。

71. 某工业项目及其中 I 车间的有关建设费用如下表所示, 则 I 车间应分摊的生产工艺设计费应为 () 万元。

项目名称	建筑工程费 (万元)	安装工程费 (万元)	需安装设备费 (万元)	生产工艺设计 费 (万 元)
建设项目	8000	2000	4000	400
I 车间	2000	800	2000	

- A. 112.0
- B. 137.1
- C. 160.0
- D. 186.7

【答案】C

【解析】本题考查的是新增资产价值的确定。建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊, 而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊, 生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。I 车间应分摊的生产工艺设计费 = $800/2000 \times 400 = 160$ (万元)。

72. 关于缺陷责任期, 下列说法正确的是 ()。

- A. 缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期
- B. 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
- C. 缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取
- D. 屋面防水工程的防渗漏缺陷责任期为 5 年

【答案】B

【解析】本题考查的是质量保证金的处理。选项 A 错误, 缺陷责任期是指承包人对已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限; 选项 C 错误, 保修期自实际竣工日期起计算, 按照《建设工程质量管理条例》的规定; 选项 D 错误, 屋面防水工程的防渗漏保修期为 5 年。

二、多项选择题 (共 24 题, 每题 2 分, 每题的备选项中, 有 2 个或 2 个以上符合题意, 至少有 1 个错项。错选, 本题不得分; 少选, 所选的每个选项得 0.5 分)

1. 构成进口设备原价的费用**中, 应以到岸价为计算基数的有 ()。

- A. 国际运费
- B. 进口环节增值税
- C. 银行财务费



- D. 外贸手续费
- E. 进口关税

【答案】DE

【解析】本题考查的是进口设备原价的构成及计算。选项 A 错误, 国际运费计算基数是离岸价格 FOB; 选项 B 错误, 进口环节增值税的计算基数是关税完税价格+关税+消费税; 选项 C 错误, 银行财务费的计算基数是离岸价格 FOB。

2. 按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定, 下列费用项目应列入材料费的有 ()。

- A. 周转材料的摊销、租赁费用
- B. 材料运输损耗费用
- C. 施工企业对材料进行一般鉴定、检查发生的费用
- D. 材料运杂费中的增值税进项税额
- E. 材料采购及保管费用

【答案】ABE

【解析】本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成及计算。选项 C 错误, 施工企业对材料进行一般性鉴定、检查发生的费用属于企业管理费; 选项 D 错误, 当一般纳税人采用一般计税方法时, 材料单价中的材料原价、运杂费等均应扣除增值税进项税额。

3. 关于国外建筑安装工程费用中的开办费, 下列说法正确的有 ()。

- A. 开办费项目可以按单项工程分别单独列出
- B. 单项工程建筑安装工程量越大, 开办费在工程价格中的比例越大
- C. 开办费包括的内容因国家和工程的不同而异
- D. 开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价
- E. 第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容

【答案】ACD

【解析】本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。选项 B 错误, 单项工程建筑安装工程量越大, 开办费在工程价格中的比例就越小; 选项 E 错误, 第三者责任险投保费属于管理费的组成内容。

4. 下列与项目建设有关的其他费用中, 属于建设管理费的有 ()。

- A. 建设单位管理费
- B. 引进技术和引进设备其他费
- C. 工程监理费
- D. 场地准备费
- E. 工程总承包管理费

【答案】ACE

【解析】本题考查的是与项目建设有关的其他费用。建设管理费的内容包括: 建设单位管理费; 工程监理费; 工程总承包管理费。

5. 关于工程量清单计价的基本程序和方法, 下列说法正确的有 ()。

- A. 单位工程造价通过直接费、间接费、利润汇总
- B. 计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段
- C. 项目特征和计量单位的确定与施工组织设计无关
- D. 招标文件中划分的由投标人承担的风险费用应隐含在综合单价中
- E. 工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束

【答案】BD

【解析】本题考查的是工程计价基本程序。选项 A 错误, 单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金; 选项 C 错误, 确定项目特征与施工组织设计有关; 选项 E 错误, 工程量清单计价活动涵盖施工招标、合同管理以及竣工交付全过程, 主要包括: 编制招标工程量清单、招标控制价、投标报价, 确定合同价, 进行工程计量与价款支付、合同价款的调整、工程结算和工程计价纠纷处理等活动。

6. 为有利于措施费的确定和调整, 根据现行工程量计算规范, 适宜采用单价措施项目计价的有 ()。

- A. 夜间施工增加费
- B. 二次搬运费



- C. 施工排水、降水费
- D. 超高施工增加费
- E. 垂直运输费

【答案】CDE

【解析】本题考查的是措施项目清单。脚手架工程,混凝土模板及支架(撑),垂直运输,超高施工增加,大型机械设备进出场及安拆,施工排水、降水等,这类措施项目按照分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价,更有利于措施费的确定和调整。

7. 下列费用中,由招标人填写金额,投标人直接计入投标总价的有()。

- A. 材料设备暂估价
- B. 专业工程暂估价
- C. 暂列金额
- D. 计日工合价
- E. 总承包服务费

【答案】BC

【解析】本题考查的是其他项目清单。材料设备暂估价计入综合单价,并不是直接计入投标总价;计日工单价由投标人自主报价,乘以暂定数量计入投标总价中;总承包服务费投标时,费率及金额由投标人自主报价,计入投标总价中。

8. 关于计时观察法测定定额,下列表述正确的有()。

- A. 计时观察法能为进一步挖掘生产潜力提供技术依据
- B. 计时观察前需选定的正常施工条件中包括了对工人技术等级的选定
- C. 测时法主要用来测定定时重复的循环工作的时间消耗
- D. 写实记录法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法
- E. 工作日写实法可以用于检查定额的执行情况

【答案】ABCE

【解析】本题考查的是计时观察法。计时观察法可消除不合理的工时损失和进一步挖掘生产潜力提供技术根据。计时观察前的准备工作选定正常的施工条件,一般包括工人的技术等级、工具及设备的种类和质量、工程机械化程度、材料实际需要量等等。计时观察法中的测时法,主要适用于测定定时重复的循环工作的工时消耗。写实记录法,是一种研究各种性质的工作时间消耗的方法。工作日写实法,运用此法主要有两个目的,一是取得编制定额的基础资料;二是检查定额的执行情况,找出缺点,改进工作。

9. 根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目已包括在人工日工资单价内的有()。

- A. 节约奖
- B. 流动施工津贴
- C. 高温作业临时津贴
- D. 劳动保护费
- E. 探亲假期间工资

【答案】ABCE

【解析】本题考查的是人工日工资单价组成内容。人工日工资单价由计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴以及特殊情况下支付的工资组成。奖金如节约奖、劳动竞赛奖等。津贴补贴如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温(寒)作业临时津贴、高空津贴等。特殊情况下支付的工资如因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习等。职工福利费和劳动保护费从人工日工资单价中删除。

10. 关于概算定额及其编制,下列说法正确的有()。

- A. 概算定额表达的主要内容、主要方式及基本使用方法与预算定额相近
- B. 概算定额与预算定额的不同之处,在于项目划分和综合扩大程度上的差异
- C. 概算定额是确定概算指标中各种消耗量的依据
- D. 概算定额与预算定额之间的水平差一般在10%左右
- E. 概算定额项目可以按工程结构划分,也可以按工程部位划分

【答案】ABE



【解析】本题考查的是概算定额及其基价编制。选项 C 错误, 概算指标中各种消耗量指标的确定, 则主要来自各种预算或结算资料。选项 D 错误, 概算定额与预算定额之间的水平差一般在 5% 左右。

11. 建设项目造价指数属于总指数, 是由 () 综合编制而成。

- A. 人、材、机价格指数
- B. 企业管理费价格指数
- C. 设备、工器具价格指数
- D. 建筑安装工程造价指数
- E. 工程建设其他费用指数

【答案】CDE

【解析】本题考查的是工程造价指数的编制。建设项目或单项工程造价指数是由建筑安装工程造价指数, 设备、工器具价格指数和工程建设其他费用指数综合而成的。

12. 下列估算方法中, 不适用于可行性研究阶段投资估算的有 ()。

- A. 生产能力指数
- B. 比例估算法
- C. 系数估算法
- D. 指标估算法
- E. 混合法

【答案】ABCE

【解析】本题考查的是静态投资部分的估算方法。在项目建议书阶段, 投资估算的精度较低, 可采取简单的匡算法, 如生产能力指数法、系数估算法、比例估算法或混合法等, 在条件允许时, 也可采用指标估算法; 在可行性研究阶段, 投资估算精度要求高, 需采用相对详细的投资估算方法, 即指标估算法。

13. 关于建筑设计对工业项目工程造价的影响, 下列说法正确的有 ()。

- A. 建筑周长系数越高, 单位面积造价越低
- B. 单跨厂房柱间距不变, 跨度越大, 单位面积造价越低
- C. 多跨厂房跨度不变, 中跨数目越多, 单位面积造价越高
- D. 超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济
- E. 大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价

【答案】BD

【解析】本题考查的是影响工业建设项目工程造价的主要因素。选项 A 错误, 通常情况下建筑周长系数越低, 设计越经济; 选项 C 错误, 对于多跨厂房, 当跨度不变时, 中跨数目越多越经济, 这是因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少; 选项 E 错误, 对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构。

14. 在编制单位建筑工程施工图预算时, 一般应计入综合取定的措施项目费的有 ()。

- A. 施工降水费用
- B. 冬雨季施工增加费
- C. 夜间施工增加费
- D. 模板费用
- E. 脚手架费用

【答案】BC

【解析】本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。不宜计量的措施项目包括安全文明施工费, 夜间施工增加费, 非夜间施工照明费, 二次搬运费, 冬雨季施工增加费, 地上、地下设施和建筑物的临时保护设施费, 已完工程及设备保护费等。

15. 关于工程施工项目最高投标限价编制的注意事项, 下列说法正确的有 ()。

- A. 未采用工程造价管理机构发布的工程造价信息时, 应予以说明
- B. 施工机械设备的选型应本着经济实用、平均有效的原则确定
- C. 暂估价中的材料单价应通过市场调查确定
- D. 不可竞争措施项目费应按国家有关规定计算
- E. 竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定



【答案】 ADE

【解析】 本题考查的是招标控制价的编制。选项 B 错误, 施工机械设备的选型直接关系到综合单价水平, 应根据工程项目特点和施工条件, 本着经济实用、先进高效的原则确定。选项 C 错误, 暂估价中的材料单价应按照工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算, 工程造价信息未发布的材料单价, 其单价参考市场价格估算。

16. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013), 关于投标文件措施项目计价表的编制, 下列说法正确的有 ()。

- A. 单价措施项目计价表应采用综合单价方式计价
- B. 总价措施项目计价表应包含规费和建筑业增值税
- C. 不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目计价表
- D. 总价措施项目的内容确定与招标人拟定的措施清单无关
- E. 总价措施项目的内容确定与投标人投标时拟定的施工组织设计无关

【答案】 AC

【解析】 本题考查的是投标报价的编制方法和内容。对于不能精确计量的措施项目, 应编制总价措施项目清单与计价表。投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则: (1) 措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定。(2) 措施项目费由投标人自主确定, 但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价, 不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠, 投标人也不得将该项费用参与市场竞争。

17. 投标人在递交投标文件后, 其投标保证金按规定不予退还的情形有 ()。

- A. 投标人在投标有效期内撤销投标文件的
- B. 投标人拒绝延长投标有效期的
- C. 投标人在投标截止日前修改投标文件的
- D. 中标后无故拒签合同协议书的
- E. 中标后未按招标文件规定提交履约担保的

【答案】 ADE

【解析】 本题考查的是编制投标文件。出现下列情况的, 投标保证金将不予退还: (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件; (2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

18. 与其他工程总承包方式相比较, 交钥匙总承包的优越性有 ()。

- A. 有利于满足业主的特殊要求
- B. 有利于降低总包商承担的风险
- C. 有利于调动总包商的积极性
- D. 有利于简化业主与承包商之间的关系
- E. 有利于加大业主的介入程度

【答案】 ACD

【解析】 本题考查的是工程总承包合同价款的约定。交钥匙总承包与其他工择总承包方式相比, 交钥匙总承包的优越性: (1) 能满足某些业主的特殊要求。(2) 承包商承担的风险比较大, 但获利的机会比较多, 有利于调动总包的积极性。(3) 业主介入的程度比较浅, 有利于发挥承包商的主观能动性。(4) 业主与承包商之间的关系简单。

19. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201), 下列事项应纳入工程变更范围的有 ()。

- A. 改变工程的标高
- B. 改变工程的实施顺序
- C. 提高合同中的工作质量标准
- D. 将合同中的某项工作转由他人实施
- E. 工程设备价格的变化

【答案】 ABC

【解析】 本题考查的是工程变更类合同价款调整。工程变更的范围和内容包括: (1) 增加或减少合同中任何工作, 或追加额外的工作; (2) 取消合同中任何工作, 但转由他人实施的工作除外; (3) 改变合同中任何工作的质量标准或其他特性; (4) 改变工程的基线、标高、位置和尺寸; (5) 改变工程的时间安排或实施顺序。



20. 因发包人原因导致工程延期时, 下列索赔事件能够成立的有 ()。

- A. 材料超期储存费用索赔
- B. 材料保管不善造成的损坏费用索赔
- C. 现场管理费索赔
- D. 保险费索赔
- E. 保函手续费索赔

【答案】 ACDE

【解析】 本题考查的是索赔。材料保管不善造成的损坏费用不能索赔。

21. 承包人提交的已完工程进度款支付申请中, 应计入本周期完成合同价款中的有 ()。

- A. 本周期已完成单价项目的金额
- B. 本周期应支付的总价项目的金额
- C. 本周期应扣回的预付款
- D. 本周期应支付的安全文明施工费
- E. 本周期完成的计日工价款

【答案】 ABDE

【解析】 本题考查的是预付款及期中支付。本周期合计完成的合同价款, 其中包括: (1) 本周期已完成单价项目的金额; (2) 本周期应支付的总价项目的金额; (3) 本周期已完成的计日工价款; (4) 本周期应支付的安全文明施工费; (5) 本周期应增加的金额。

22. 下列施工合同履行情形中, 当事人提出解除合同, 人民法院应予支持的有 ()。

- A. 发包人提供的建筑材料不满足承包人要求, 承包人请求解除合同
- B. 发包人延迟 28 天支付工程款, 承包人请求解除合同
- C. 承包人以行为表明不履行合同主要义务, 发包人请求解除合同
- D. 承包人拒绝修复已完不合格工程, 发包人请求解除合同
- E. 承包人将工程违法分包, 发包人请求解除合同

【答案】 CDE

【解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。承包人具有下列情形之一, 发包人请求解除建设工程施工合同的, 应予支持: (1) 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的; (2) 合同约定的期限内没有完工, 且在发包人催告的合理期限内仍未完工的; (3) 已经完成的建设工程质量不合格, 并拒绝修复的; (4) 将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

23. 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216), 下列关于预付款的说法正确的有 ()。

- A. 合同约定预付款保函的, 发包人在收到预付款保函后 7 天内向承包人支付预付款金额
- B. 预付款的抵扣方式、比例等, 由合同双方在专用条款中约定
- C. 预付款抵扣完后, 发包人应及时向承包人退还预付款保函
- D. 合同解除时预付款尚未扣完的, 发包人应直接从预付款保函中扣除尚未扣完款项
- E. 合同未约定承包人提交保函的, 尚未扣回的预付款应直接从履约保函中扣回

【答案】 BC

【解析】 本题考查的是工程总承包合同价款的结算。选项 A 错误, 合同约定预付款保函的, 发包人在收到预付款保函后 10 天内向承包人支付预付款金额; 选项 D 错误, 在发包人签发工程接收证书或合同解除时, 预付款尚未抵扣完的, 发包人有权要求承包人支付尚未抵扣完的预付款; 选项 E 错误, 应付给承包人或属于承包人的款项不足以抵扣, 且合同未约定承包人提交预付款保函的, 承包人应与发包人签订支付尚未扣完的预付款支付时间安排协议书。

24. 编制建设项目竣工决算必须满足的条件包括 ()。

- A. 经批准的初步设计所确定的工程内容已完成
- B. 单项工程或建设项目竣工结算已完成
- C. 收尾工程竣工结算已完成
- D. 预留费用不超过规定比例
- E. 涉及工程质量纠纷事项已处理完毕

【答案】 ABDE



【解析】本题考查的是竣工决算的内容和编制。编制工程竣工决算应具备下列条件：经批准的初步设计所确定的工程内容已完成；单项工程或建设项目竣工结算已完成；收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例；涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕；其他影响工程竣工决算编制的重大问题已解决。

233网校
www.233.com

新人注册大礼包

立即领取

2020一级造价 教材考点/模拟套卷/免费视频



扫描下方二维码，添加小造君微信号
邀您进入“233网校2020造价工程师备考群”



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

一级造价工程师高端班 7元/天

每天一顿早餐前, 突破考试及格线

- ◆ 涵盖 7 大班级
- ◆ 送专题班
- ◆ 送 2 年纸质讲义



二维码免费听课 ▶



温馨提示: 具体配套服务以线上为准

【你将获得】

- 7 大班 级阶梯式锁分, 系统化辅导通关
- 送 8 本课程讲义, 帮助扔掉厚重教材
- 1 个科目 2 个老师主讲, 14 位大咖坐镇授课
- 2 个考期+免费重学 2 年, 可参加 4 次考试
- 5 小时内答疑, 不留任何疑问
- 报考不成功, 全额退费

8 本纸质资料: 授课名师编写, 专业品质保障

配有经典考题, 掌握答题“套路”

与教材精讲班搭配学习, 效果立竿见影



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握
